



وثيقة المنتج وخطة التنفيذ

منصة داخلية لإدارة دورة حياة المنافسات والعقود الحكومية، من إنشاء الطلب حتى إقفال العقد، مع متابعة تنفيذ المشروع والمقاول والمستخلصات والتقارير.

نظام التشغيل الداخلي حول «اعتماد»: يحوّل العمل اليدوي إلى سير عمل مؤتمت مدعوم بالذكاء الاصطناعي تحت إشراف بشري، ويلتزم بالضوابط الأساسية للأمن السيبراني (ECC).

الإعداد
Kareem Adel
Mohammed

التصنيف
سري

التاريخ
يونيو 2026

الإصدار
2.0 – نسخة محررة

13~ أدوار وصلاحيات (RBAC)	18 إجراء لدورة حياة العقد	10 مراحل دورة حياة المنافسة
24 أسبوعاً – جدول زمني مرجعي	145 مهمة تنفيذية في خطة العمل	108 ضابط أمن سيرياني (ECC) ضمن 4 مكونات

ماذا تقدّم «تنفيذ» باختصار؟

- **مسار واحد واضح** من إنشاء الطلب حتى إقفال العقد، بصلاحيات دقيقة وسجل كامل لكل إجراء.
- **تكامل مع «اعتماد»** لا استبدال له، وتولّي ما بعد التوقيع: المقاول، المستخلصات، الإنذارات، الاستلام.
- **ذكاء اصطناعي مساعد** يقترح ويشرح، والقرار النهائي دائماً للمستخدم المختص.
- **التزام أمني** بالضوابط الأساسية للأمن السيرياني (ECC) وإقامة البيانات داخل المملكة.

★ **الفكرة الجوهرية:** «تنفيذ» ليست مجرد لوحة معلومات، بل منظومة تشغيل كاملة تربط الجهة بالمقاول واللجان والإدارات والجهات الرقابية في نظام واحد محكوم ومدقّق.

1	الملخص التنفيذي	9	نطاق التسليم والأولويات
2	نطاق المنتج وحدوده	10	الجدول الزمني وخطة التنفيذ
3	المستخدمون والصلاحيات	11	الاعتماديات والمخاطر
4	دورة العمل الأساسية	12	القرارات المطلوبة
5	إدارة العقد بعد التوقيع	13	الأمن السيبراني والحماية (ECC)
6	سيناريو تشغيلي متكامل	14	قصص المستخدمين
7	الذكاء والتقارير والتكاملات	15	السيناريوهات بالتفصيل
8	القواعد والمتطلبات الأساسية	16	الأسئلة الشائعة (FAQ)

طريقة القراءة: الأقسام من 1 إلى 8 تشرح المنتج وضوابطه. الأقسام من 9 إلى 12 هي خطة التنفيذ والاعتماد. ويُلاحق بالوثيقة ملحق أ – سجل المهام التفصيلي يفصل كل مهمة بفئتها (البنية التحتية/واجهة المستخدم/تكامل الأنظمة/ذكاء/التشغيل والنشر/اختبارات الجودة/تصميم/إدارة) ووصفها واعتمادياتها وحالتها وساعاتها التقديرية.

»» 1. الملخص التنفيذي

ما الذي تقدمه منصة تنفيذ؟

«تنفيذ» منصة داخلية تساعد الجهة الحكومية على إدارة المنافسات والعقود والمشاريع في مسار واحد واضح، مع صلاحيات دقيقة وسجل كامل لكل إجراء. تتكامل المنصة مع «اعتماد» ولا تستبدلها. تتولى «اعتماد» عمليات الطرح واستقبال العروض والترسية، بينما تدير «تنفيذ» الأعمال الداخلية للجهة، ثم تتابع العقد والمشروع بعد التوقيع.

القيمة الرئيسية

- **حوكمة واضحة:** لا يتغير وضع الطلب أو العقد إلا من خلال إجراء معتمد ومصرح به.
- **متابعة كاملة:** تعرض المنصة حالة المشروع، التأخير، الخطابات، المستخلصات، والتزامات المقاول.
- **سجل تدقيق:** يسجل النظام من قام بالإجراء، ووقته، والحالة قبل الإجراء وبعده.
- **ذكاء مساعد:** يقترح النظام الإجراء المناسب ويشرح سببه، ويبقى القرار النهائي للمستخدم المختص.

مبدأ أساسي: الذكاء الاصطناعي لا يعتمد قرارا ماليا أو تعاقديا أو تنظيميا بصورة تلقائية.

» 2. نطاق المنتج وحدوده

العلاقة بين تنفيذ واعتماد

منصة «تنفيذ»

- إعداد الطلب والكراسة والموافقات الداخلية واللجان.
- تحليل العروض داخلياً وعكس العقد الموقع.
- **ما بعد التوقيع:** المشروع، المقاول، الخطابات، المستخلصات، التعديلات، الاستلام.

منصة «اعتماد»

- نشر المنافسة واستقبال العروض.
- إجراءات الترسية.
- قد تكون منصة التوقيع ومصدر بيانات العقد.

الفجوة التي تملؤها «تنفيذ»: كل ما يأتي بعد الترسية والتوقيع – وهو ما لا تغطيه «اعتماد».

داخل النطاق

- إدارة الطلبات والمنافسات والعقود والمشاريع.
- سير الموافقات والإسناد والتوقيع والمراسلات الرسمية.
- بوابة المقاول، متابعة التقدم، وإدارة إجراءات العقد.
- التقارير واللوحات وسجل التدقيق والتكاملات المطلوبة.

خارج النطاق الحالي

- استبدال منصة اعتماد أو تكرار وظائفها الرسمية.
- تنفيذ قرارات الذكاء الاصطناعي دون اعتماد بشري.
- البلوك تشين والمساعد الصوتي والقدرات المتقدمة قبل اكتمال النواة.

3. المستخدمون والصلاحيات

من يستخدم المنصة؟

المستخدم	المسؤوليات الرئيسية	نطاق الوصول
إدارة العقود والمشتريات	إدارة المنافسة والعقد والإجراءات والمراسلات.	بحسب الإدارة والصلاحيات.
الإدارة الطالبة أو المشرفة	إنشاء الطلب، متابعة التنفيذ، والتحقق من أداء المقاول.	مشاريعها وطلباتها.
الإدارة المالية	الميزانية، الارتباط، المستخلصات، والضمانات.	البيانات المالية المصرح بها.
الإدارة العليا	الاعتماد النهائي والتصعيد والتوقيع.	القرارات واللوحات التنفيذية.
المقاول	مراجعة العقد، تحديث التقدم، تقديم الطلبات، والرد على الخطابات.	عقوده فقط.
الرقابة	مراجعة الامتثال وسجل التدقيق.	قراءة وتدقيق فقط.
مدير المنصة	إدارة المستخدمين والأدوار وإعدادات سير العمل.	إدارة النظام دون تجاوز عزل الجهات.

قاعدة الصلاحيات: كل مستخدم يرى وينفذ ما تسمح به صلاحياته فقط، وكل إسناد أو تفويض يسجل في النظام.

»» 4. دورة العمل الأساسية

من الطلب حتى بدء المشروع

5 فتح العروض الفنية	4 إعلان المنافسة	3 التأهيل المسبق	2 إعداد كراسة الشروط	1 إنشاء الطلب واعتماده
10 بدء المشروع والمباشرة	9 إعداد العقد وتوقيعه	8 التقييم المالي والترسية	7 فتح العروض المالية	6 التقييم الفني

قاعدة قابلة للتمهية: إذا تجاوزت الميزانية الحد المعتمد، يفصل النظام المستند الفني عن المالي. كما يختلف إجراء المباشرة بين مشاريع التوريد ومشاريع الصيانة.

» 5. إدارة العقد بعد التوقيع

محور المنتج الأساسي

بعد توقيع العقد تبدأ متابعة التنفيذ الفعلي. يعرض النظام المعالم، المخطط مقابل الفعلي، جداول الكميات، المستخلصات، الخطابات، القرارات.

الإجراءات ذات الأولوية في النواة

المجموعة	الإجراءات	الأثر
بدء ومتابعة العمل	بدء الأعمال، تسليم الموقع، إيقاف العمل، استئناف العمل.	تحديث حالة المشروع ومدته.
معالجة التعثر	إنذار، إنذار نهائي، سحب الأعمال.	توثيق المخالفة والتععيد.
تعديل العقد	أمر تعديلي، تمديد العقد.	تعديل النطاق أو القيمة أو المدة.
الحقوق المالية	المستخلصات، التنازل، الضمانات.	تسجيل الأثر المالي والضمانات.
الإقفال	الاستلام الابتدائي، الاستلام النهائي، إنهاء العقد.	إقفال العقد وتقييم المقاول.

ضابط المراسلات: كل خطاب خارجي يحصل على رقم وتاريخ مرجعين قبل إرساله، ويسجل مع الاعتمادات والمرفقات.

6. سيناريو تشغيلي متكامل

التأخير، الإنذار، سحب الأعمال، وعقد الاستكمال

1

تُظهر **لوحة المشروع** تأخر المقاول مقارنةً بالخطة.

2

يقترح **الذكاء الاصطناعي** إصدار إنذار ويوضح سبب الاقتراح.

3

قرار بشري: تراجع الإدارة المشرفة الاقتراح وتعتمده أو تعدّله أو ترفضه.

4

يُنشئ النظام **خطاب الإنذار** ويحصل على رقم مرجعي ثم يُرسله.

5

يردّ المقاول داخل المنصة خلال المهلة المحددة.

6

تحقق: تراجع الإدارة الرد – وعند عدم المعالجة يصدر **إنذار نهائي**.

7

إذا استمر الإخلال، يُعتمد **سحب الأعمال** وفق الصلاحيات.

8

يُنشئ النظام **عقد استكمال** مرتبطاً بالعقد الأصلي ويحمل إليه الأعمال المتبقية.

9

تُسجّل كل الخطوات والقرارات في **سجل التدقيق**.

معيّار قبول النواة: ينجح هذا السيناريو كاملاً على عقد تجريبي، مع الصلاحيات والمراسلات والتدقيق وربط عقد الاستكمال.

7. الذكاء والتقارير والتكاملات

قدرات مساندة للعمل التشغيلي

الذكاء الاصطناعي

- اقتراح الإجراء التالي مع السبب والمصادر.
- تنبيه المستخدم إلى مخاطر التأخير والامثال.
- تلخيص العقود والخطابات والمستندات.
- يتطلب كل قرار مؤثر مراجعة واعتمادا بشريا صريحا.

اللوحات والتقارير

- لوحة مدير العقود: العقود النشطة والمتعثرة والقريبة من الانتهاء.
- لوحة الإدارة العليا: الالتزامات، الأداء، المخاطر، والامثال.
- لوحة المقاول: التزاماته، تحديثاته، طلباته، وخطاباته.
- تقارير قابلة للتصدير بصيغ PDF و Excel و CSV.

التكاملات ذات الأولوية

الأولوية	التكامل	الغرض
حرج	اعتماد، نفاذ، وزارة المالية	المنافسات، الهوية، والميزانية.
عال	التوقيع الإلكتروني، التأمينات الاجتماعية	توقيع المستندات والتحقق من المورد.
متوسط	ERP/CRM، واتساب للأعمال	المزامنة والإشعارات.

8. القواعد والمتطلبات الأساسية

ضوابط لا يجوز تجاوزها أثناء التنفيذ

المجال	القاعدة
سير العمل	كل تغيير حالة يتم من خلال انتقال معتمد ومصرح به.
التدقيق	يسجل كل إجراء مؤثر مع الفاعل والوقت والحالة قبل الإجراء وبعده.
الذكاء الاصطناعي	لا ينفذ قرار مؤثر دون مراجعة واعتماد بشري.
الصلاحيات	الوصول مبني على الدور والصلاحيات والجهة والعقد.
المراسلات	لا يرسل خطاب خارجي دون رقم وتاريخ مرجعيين.
التكاملات	تحافظ المنصة على التوافق مع مصادر البيانات الرسمية.
الأمن	استضافة داخل المملكة، تشفير، عزل الجهات، والالتزام بمتطلبات NCA وCST.
التوطين	دعم العربية والإنجليزية، اتجاه RTL، التاريخين الهجري والميلادي، والريال.
التهيئة	سلاسل الاعتماد والحدود والقواعد تضبط من الإعدادات، لا من كود مخصص.
تعريف الإنجاز	لا تعد الميزة منجزة قبل اختبارها من طرف إلى طرف.

9. نطاق التسليم والأولويات

ما الذي يسلم أولاً؟

الحزمة	النطاق	معياري الإنجاز
النواة التشغيلية	الهوية والصلاحيات، عزل الجهات، سير العمل، التدقيق، المستندات، المراسلات، وتسجيل المقاول.	تشغيل عقد تجريبي بصلاحيات صحيحة وسجل كامل.
تنفيذ العقد	بوابة المقاول، المباشرة، التقدم، جداول الكميات، الإنذارات، وسحب الأعمال.	نجاح السيناريو التشغيلي المتكامل.
الدورة الكاملة	اللجان، التقييم، الترسية، التوقيع، الإجراءات المالية، الإقفال، وربط العقود.	إدارة دورة كاملة من الطلب إلى الإقفال.
التكامل والذكاء	التكاملات الفعلية، لوحات الإدارة، المخاطر، الامتثال، والتحليلات المتقدمة.	تشغيل التكاملات ومؤشرات الأداء المتفق عليها.

خريطة الملاحم المختصرة

E01-E07 أسس المنصة. E08-E12 ما قبل الترسية والتوقيع. E13-E18 تنفيذ العقد والمقاول. E19-E20 الذكاء والتقارير. E21-E22 التكاملات والتوطين.

10. الجدول الزمني وخطة التنفيذ

خطة مرجعية لمدة 24 أسبوعاً من تاريخ البدء

افتراض التخطيط: يبدأ احتساب الأسابيع بعد اعتماد النطاق وتوفير الفريق وبيئات التكامل. يعاد ضبط الجدول بعد ورشة الانطلاق.

المرحلة	التسليمات	4-1	8-5	12-9	16-13	20-17	24-21
التهيئة والتصميم	اعتماد النطاق، تصميم سير العمل، خطة التكامل، ومعايير القبول.	تنفيذ					
أسس المنصة	الصلاحيات، عزل الجهات، التدقيق، المستندات، والمراسلات.	بدء	تنفيذ	اعتماد			
النواة التشغيلية	تسجيل المقاول، البوابة، المباشرة، التقدم، والإنذارات.		بدء	تنفيذ	MVP		
الدورة الكاملة	اللجان، الترسية، التوقيع، بقية إجراءات العقد، والإقفال.			بدء	تنفيذ	اعتماد	
التكاملات واللوحات	التكاملات الفعلية، تقارير الإدارة، والمخاطر.				بدء	تنفيذ	إطلاق
الاختبار والإطلاق	اختبار شامل، ترحيل تجريبي، تدريب، وإطلاق تدريجي.					اختبار	إطلاق

المعالم الرئيسية

المعلم	الموعد المرجعي	شرط الاعتماد
M0 – اعتماد التصميم	نهاية الأسبوع 4	اعتماد النطاق وسير العمل والتكاملات.
M1 – جاهزية الأسس	نهاية الأسبوع 8	الصلاحيات والتدقيق والمستندات والمراسلات تعمل.
M2 – النواة التشغيلية MVP	نهاية الأسبوع 16	نجاح سيناريو التأخير حتى عقد الاستكمال.
M3 – اكتمال الدورة	نهاية الأسبوع 20	تشغيل الدورة من الطلب إلى الإقفال.
M4 – الإطلاق التدريجي	نهاية الأسبوع 24	اجتياز الاختبارات والتدريب وخطة الدعم.

11. الاعتماديات والمخاطر

ما الذي قد يؤثر في الجدول؟

المسار الحرج

E01 → E03 → E05 → E13 → E14 → E15 → E16 → E17

تعتمد النواة على جاهزية الصلاحيات ومحرك سير العمل والمراسلات قبل بناء بوابة المقاول وإجراءات التنفيذ.

الخطر	الأثر	الإجراء المقترح
تأخر واجهات التكامل الرسمية	تأخير التوقيع والمزامنة والتحقق.	استخدام بيانات محاكاة وعقود تكامل واضحة حتى توفر الربط الفعلي.
عدم اعتماد سلاسل الموافقات	تعطيل تصميم سير العمل.	ورشة قرار مبكرة واعتماد نسخة أولى قابلة للتهيئة.
توسيع النطاق أثناء التنفيذ	تأخير النواة والإطلاق.	تثبيت نطاق MVP وإدارة الطلبات الجديدة كمرحلة لاحقة.
عدم وضوح بيانات الضمانات والمستخلصات	مخاطر مالية وتشغيلية.	اعتماد نموذج البيانات والسياسات مع المالية قبل المرحلة الثالثة.
ضعف جودة البيانات	تقارير وتوصيات غير دقيقة.	قواعد تحقق، تنظيف البيانات، ومؤشرات جودة مستمرة.

»» 12. القرارات المطلوبة

قرارات يجب حسمها قبل اعتماد الخطة النهائية

1. اعتماد حدود نطاق MVP والميزات المؤجلة.
2. اعتماد سلاسل الموافقات لكل إجراء تعاقد.
3. تحديد دور الإدارة المشرفة وعلاقتها بالإدارة الطالبة.
4. تحديد صلاحيات الرقابة ومدير المنصة ومدير الجهة.
5. تحديد مصدر الأرقام المرجعية للمراسلات الرسمية.
6. اعتماد آلية التحقق من هوية المقاول والسجل التجاري.
7. اعتماد نموذج الضمانات والمستخلصات والمحتجزات.
8. تأكيد جاهزية التكاملات ومالكها وبيئات الاختبار.
9. اعتماد الفريق وتاريخ بدء خطة الأسابيع الأربعة والعشرين.

الخطوة التالية: عقد ورشة انطلاق لاعتماد القرارات السابقة وتحويل الجدول المرجعي إلى خطة تنفيذ مؤرخة وموزعة على الفرق.

13. الأمن السيبراني والحماية

الالتزام بالضوابط الأساسية للأمن السيبراني (ECC-2:2024) من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني

تلتزم «تنفيذ» بالضوابط الأساسية للأمن السيبراني (ECC-2:2024): أربعة مكونات رئيسية، و28 مكوناً فرعياً، و108 ضوابط. تُقسّم المسؤولية إلى ضوابط **تبنيتها المنصة**، وضوابط **تنظيمية** على الجهة (وظيفة الأمن السيبراني)، وضوابط **مشتركة** مع مزود الاستضافة السحابية.

مبدأ المسؤولية المشتركة: تبني «تنفيذ» الضوابط التقنية في المنصة وتُمكن الجهة من إثبات الالتزام، بينما تبقى الحكومة والسياسات والتوعية والتدقيق من مسؤولية الجهة، وأمن مركز البيانات من مسؤولية مزود الاستضافة المعتمد داخل المملكة.

المكون (ECC)	ما تطبقه «تنفيذ»	المسؤولية
1 – حوكمة الأمن السيبراني	تمكين السياسات والأدوار وسجل المخاطر والتدقيق داخل المنصة.	الجهة + المنصة
2 – تعزيز الأمن السيبراني	الهويات ومFA، التشفير، أمن الشبكات والبريد، إدارة الثغرات، المراقبة (SIEM)، حماية الويب (WAF)، حماية البيانات.	المنصة
3 – صمود الأمن السيبراني	النسخ الاحتياطي والاستعادة وخطة الاستمرارية وأهداف RTO/RPO.	المنصة + الاستضافة
4 – الأطراف الخارجية والحوسبة السحابية	تقييم الموردين، إقامة البيانات داخل المملكة، ونموذج المسؤولية المشتركة مع مزود السحابة.	المنصة + المزود

1 حوكمة الأمن السيبراني

سياسات · أدوار · مخاطر · تدقيق · موارد بشرية · توعية

2 تعزيز الأمن السيبراني

هويات ومFA · تشفير · شبكات · بريد · ثغرات · WAF · SIEM

3 صمود الأمن السيبراني

نسخ احتياطي · استعادة · استمرارية · RTO/RPO

4 الأطراف الخارجية والحوسبة السحابية

تقييم الموردين · إقامة البيانات · المسؤولية المشتركة

ما تبنيه المنصة (ضوابط تقنية)

- تشفير البيانات عند التخزين والنقل وإدارة المفاتيح، ومصادقة متعددة العناصر (MFA)، وصلاحيات دقيقة وأقل صلاحية وفصل المهام وإدارة الصلاحيات المميزة.
- سجل تدقيق غير قابل للتلاعب ومراقبة مستمرة عبر SIEM، وعزل المستأجرين، وإقامة البيانات داخل المملكة.
- جدار حماية تطبيقات الويب (WAF) وHTTPS ومعمارية متعددة الطبقات، ودورة تطوير آمنة (ترميز آمن، فحص ثغرات، اختبار اختراق).
- النسخ الاحتياطي والاستعادة وخطة الاستمرارية، وإدارة حوادث الأمن السيبراني والاستجابة والإبلاغ للهيئة.
- حماية البريد (SPF/DKIM/DMARC) وحماية الشبكات (IPS وحماية DDoS) وإدارة الثغرات والتحديثات.

مسؤولية الجهة (ضوابط تنظيمية)

- استراتيجية وسياسات الأمن السيبراني وإدارة المخاطر والتوعية والتدريب.
- الأمن السيبراني للموارد البشرية، والتدقيق الدوري والتقييم الذاتي لمطابقة ECC، والأمن المادي.

الربط بالخطوة: تفاصيل تنفيذ هذه الضوابط على مستوى المهمة في **ملحق أ – المسار S (الأمن السيبراني والحماية)**، وتُحدَّث المواعمة مع كل إصدار من الضوابط.

» 14. قصص المستخدمين

ماذا يريد كل مستخدم من المنصة؟ - بصيغة: بصفتي... أريد... حتى...

الإدارة الطالبة / المشرفة

الإدارة الطالبة أنشئ طلب مشروع بكامل الحقوق FR-WF-001 والمرفقات وأرفعه، حتى تبدأ رحلة المشتريات.	الإدارة المشرفة أبدأ طلب المباشرة بعد توقيع العقد، حتى يبدأ التنفيذ الفعلي.
الإدارة المشرفة أتابع تقدّم المقاول والمعامل، حتى أكتشف التأخر مبكراً.	الإدارة المشرفة أتحقق من ردود المقاول على الخطابات، حتى أقرر التصعيد من عدمه.
الإدارة الطالبة أبدأ شهادة الاستلام الابتدائي والنهائي، حتى يُقفل العقد نظامياً.	الإدارة الطالبة أقيم المقاول بعد التنفيذ، حتى يُغدّى مؤشر موثوقية الموردين.

إدارة العقود والمشتريات

مدير العقود أنشئ الكراسة وأسندها لموظف مع احتفاظي بالإشراف، حتى يتوزّع العمل دون فقد السيطرة.	موظف العقود أصدر خطاب الترسية وخطاب النوايا، حتى تكتمل الترسية رسمياً.
موظف العقود أعدّ بيانات العقد من المسودات المعتمدة أو أستوردها من اعتماد، حتى يُعكس العقد في المنصة.	مدير العقود أطلق إجراءات العقد عبر سير عمل محكوم، حتى تُوثّق كل خطوة وتُدقّق.
مدير العقود أربط عقد الاستكمال بالعقد الأصلي عند سحب الأعمال، حتى يُكمل مقاول آخر المتبقي.	موظف العقود أدعو المقاول للتسجيل بعد التوقيع، حتى يُتّابع داخل المنصة.

الإدارة المالية

رئيس الميزانية أؤكد الميزانية وأطبّق قاعدة فصل المستندات، حتى تنضبط الوثائق.	المالية أؤكد الارتباط النهائي قبل اعتماد الترسية، حتى لا تتجاوز الالتزامات الميزانية.
المالية أدير المستخلصات مقابل جداول الكميات وتوفّر الميزانية، حتى تنضبط المدفوعات.	المالية أدير الضمانات الابتدائية والنهائية وتجديدها، حتى تبقى سارية.

الإدارة العليا والرقابة ومدير المنصة

الإدارة العليا أعتمد وأوقع وأصدّق القرارات، حتى تمضي المعاملات بحوكمة.	الإدارة العليا أرى لوحة استراتيجية بالمخاطر والأداء والامتثال، حتى أقرر بناءً على بيانات.
الرقابة أطلع على لوحة الامتثال وسجل التدقيق، حتى أتحقق من الالتزام.	مدير المنصة أدير المستخدمين والأدوار وإعدادات سير العمل، حتى تتطابق المنصة مع تنظيم الجهة.

المقاول

المقاول أقبِل الدعوة وأُسجِّل ويُربط حسابي بالسجل التجاري والعقد، حتى أعمل داخل المنصة.

المقاول أراجع وأوَقِّع وأنزِّل عقدي، حتى تكتمل التعاقدات إلكترونياً.

المقاول أبدأ طلباً (تمديد/تعديل قيمة)، حتى يدخل سير العمل المحكوم لدى الجهة.

المقاول أرفع تحديثات التقدّم بالصور والفيديو، حتى تُتَابَع الأعمال أولاً بأول.

المقاول أرَدَ على خطاب الإنذار/المستحقات داخل المنصة، حتى يُسجَّل رَدِّي قبل التصعيد.

اللجان والذكاء الاصطناعي

عضو لجنة أدخِل درجات التقييم وأوَقِّع التقارير، حتى تُعتمد نتائج التأهيل والفتح والتقييم.

مُقيّم فني أتلَقّ درجات مقترحة من الذكاء مع تفسيرها، والقرار النهائي للجنة.

أي مستخدم أتلَقّ توصية بالإجراء التالي مع سببها، حتى أقرّر بسرعة مع بقاء القرار لي.

15. السيناريوهات بالتفصيل

تغطية كل المسارات الرئيسية والاستثنائية

1. إنشاء الطلب واعتماده BR-01

الطالبة تُنشئ الطلب ← الرئيس يعتمد ← المالية تؤدّد الميزانية وتطبّق فصل المستندات عند تجاوز الحد ← الإدارة العليا تعتمد. بدائل: إرجاع مع تعليق أو رفض بسبب.

2. المباشرة – توريد مقابل صيانة BR-02

توريد: طلب مباشرة ← تأكيد ← خطاب مباشرة ← توقيع ← رقم مرجعي. صيانة: تُضاف محضر استلام موقع ولجنة الموقع وخطاب إحالة.

3. التعرّض وسحب الأعمال حرج

رصد تأخّر ← اقتراح ذكي ← اعتماد بشري ← خطاب إنذار (برقم مرجعي) ← ردّ المكاوّل ← إنذار نهائي ← سحب الأعمال ← عقد استكمال مرتبط بالأصلي. (التفصيل في القسم 6).

4. أمر تعديلي للعقد

طلب تغيير (قيمة/مدة/شروط) ← مراجعة واعتماد ← فحص العروض عند اللزوم ← توقيع ← خطاب أمر تغيير برقم مرجعي ← تحديث جداول الكميات.

5. التمديد والإيقاف والاستئناف

طلب ← اعتماد ← خطاب (تمديد/إيقاف/استئناف) برقم مرجعي ← تحديث مدة المشروع وحالته، مع فحص صلاحية الضمان.

6. المستخلصات والمستحقات

استحقاق دفعة مقابل جداول الكميات وتوفّر الميزانية ← اعتماد ← خطاب مستحقات ← تسجيل الأثر المالي.

7. الإقفال والاستلام

استلام ابتدائي (لجنة + اعتماد) ← فترة الصيانة ← استلام نهائي ← الإفراج عن الضمان النهائي ← إقفال العقد.

8. تقييم المكاوّل

الطالبة تُقيّم ← الرئيس يراجع ← الإدارة العليا تعتمد ← يُغذّى مؤشّر موثوقية الموردين.

9. توقيع العقد – سيناريو هان

أ: التوقيع في اعتماد ثم استيراد العقد وعكسه. ب: التوقيع خارج اعتماد بإنشاء بيانات العقد من المسودات المعتمدة وتأكيد المدير.

10. تسجيل المكاوّل ودعوته

بعد التوقيع: دعوة برمز أحادي ← قبول وتسجيل ← ربط بالسجل التجاري والعقد ← تحقّق نفاذ GOS ← وصول مقيّد بعقوده فقط.

تغطية كاملة: تشمل هذه السيناريوهات المسار الرئيسي والتنفيذ والمسارات الاستثنائية، وكلها انتقالات محكومة ومدقّقة.

»» 16. الأسئلة الشائعة (FAQ)

إجابات مختصرة عن أكثر الأسئلة تكراراً

؟ ما الفرق بين «تنفيذ» و«اعتماد»؟

الإجابة: «اعتماد» للطرح واستقبال العروض والترسية. «تنفيذ» تُدير الأعمال الداخلية للجهة وتتولى ما بعد التوقيع: المفاوض والمستخلصات والإنذارات والتعديلات والاستلام.

؟ هل تستبدل «تنفيذ» منصة «اعتماد»؟

الإجابة: لا: هي مكفلة لها وتتكامل معها، ولا تكرر وظائفها الرسمية.

؟ أين تُستضاف البيانات؟

الإجابة: داخل المملكة العربية السعودية، مع التشفير والعزل بين الجهات، التزاماً بمتطلبات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وهيئة الاتصالات.

؟ كيف يُضمن الأمن السيبراني؟

الإجابة: بالالتزام بالضوابط الأساسية للأمن السيبراني (ECC) عبر مكوثاتها الأربعة، بمسؤولية مشتركة بين المنصة والجهة ومزود الاستضافة (القسم 13).

؟ هل يتخذ الذكاء الاصطناعي قرارات تلقائية؟

الإجابة: لا: أي قرار مالي أو تعاقدى أو تنظيمي يتطلب مراجعة واعتماداً بشرياً صريحاً (مبدأ الإشراف البشري HITL): الذكاء يقترح ويشرح فقط.

؟ كيف يدخل المفاوض إلى المنصة؟

الإجابة: بعد توقيع العقد يرسل موظف العقود دعوة برمز أحادي، فيُسجل المفاوض ويُربط حسابه بالسجل التجاري والعقد، ويُتحقق من هويته عبر نفاذ.

؟ ماذا يحدث عند تعثر المفاوض؟

الإجابة: يرصد النظام التأخر ويقترح إنذاراً، ثم إنذاراً نهائياً، ثم سحب الأعمال عند الاستمرار. وينشئ عقد استكمال مرتبطاً بالأصلي يحمل المتبقي.

؟ كيف تُدار الصلاحيات؟

الإجابة: صلاحيات قائمة على الأدوار (RBAC): وللمدير العقود صلاحية وصول دائمة افتراضية على طلبات إدارته، والإسناد ينقل صلاحية الإجراء مع بقاء وصول المدير.

؟ هل تتكامل مع المنصات الوطنية؟

الإجابة: نعم: اعتماد ونفاذ ووزارة المالية والتأمينات الاجتماعية (GOSI)، إضافةً إلى التوقيع الإلكتروني وقنوات الإشعار.

❓ كيف تُصدر الخطابات الرسمية؟

الإجابة: من قوالب ديناميكية مع دمج بيانات العقد، ولا يُرسل أي خطاب خارجي قبل الحصول على رقم وتاريخ مرجعيين.

❓ ما الفرق بين «المشروع» و«العقد»؟

الإجابة: المشروع هو الأعمال المطلوب تنفيذها، والعقد هو المستند الموقع الذي ينظم تنفيذه؛ ويبدأ تنفيذ المشروع بعد توقيع العقد.

❓ كم تستغرق المرحلة الأولى؟

الإجابة: الجدول المرجعي 24 أسبوعاً؛ تكتمل النواة التشغيلية قرابة الأسبوع 16، ويُعاد ضبط الجدول بعد ورشة الانطلاق.

❓ هل يدعم النظام العربية والإنجليزية؟

الإجابة: نعم، بدعم كامل للعربية (RTL) والإنجليزية، والتقويمين الهجري والميلادي، والريال السعودي.

❓ هل تُسجّل كل الإجراءات؟

الإجابة: نعم، في سجل تدقيق غير قابل للتلاعب يحفظ الفاعل والوقت والحالة قبل الإجراء وبعده.

❓ ما الذي يلزم قبل البدء؟

الإجابة: حسم القرارات المطلوبة (القسم 12) وعقد ورشة انطلاق لاعتماد النطاق وسلاسل الموافقات وجاهزية التكاملات والفريق.

انتهت الوثيقة الرئيسية. يلي ذلك «ملحق أ – سجل المهام التفصيلي». نسخة محرّرة ومختصرة مع الحفاظ على نطاق المنتج وضوابطه.

ملحق أ – سجل المهام التفصيلي

كل مهمة بفتتها ووصفها واعتمادياتها وحالتها وساعاتها التقديرية

يفصل هذا الملحق العمل المطلوب لتسليم المنصة على مستوى المهمة. الساعات تقديرات هندسية استرشادية تُضبط في ورشة الانطلاق.

11~

شهر-شخص تقريباً

1,727

إجمالي الساعات التقديرية


145

إجمالي المهام

توزيع الجهد حسب الفئة (بالساعات)

35% · 607
20% · 343
9% · 159
8% · 134
3% · 55
4% · 77
1% · 24
3% · 50
16% · 278

البنية التحتية
واجهة المستخدم
تكامل الأنظمة
ذكاء
التشغيل والنشر
اختبارات الجودة
تصميم
إدارة
حماية

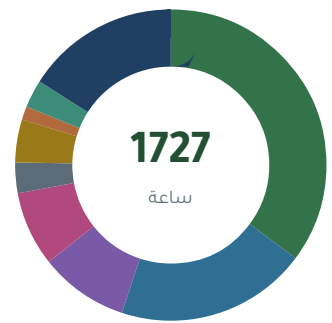

توزيع الجهد حسب المسار (بالساعات)

364
236
401
187
130
278
131

A – أسس المنصة
B – ما قبل الترسية والتوقيع
C – تنفيذ العقد والمقاول
D – الذكاء والتقارير
E – التكاملات والتوطين
S – الأمن السيبراني والحماية (ECC)
مهام عامة شاملة (اختبارات الجودة وتشغيل وتصميم وإدارة)

دليل الرموز:

البنية التحتية واجهة المستخدم تكامل الأنظمة ذكاء
التشغيل والنشر اختبارات الجودة تصميم إدارة حماية
مطلوب جاري تم الانتهاء منه

الحالة	المهام	الساعات
مطلوب	138	1647
جاري	7	80
تم الانتهاء منه	0	0

» سجل المهام – المسار A – أسس المنصة

إجمالي المسار: 364 ساعة · 37 مهمة

المعرف	المهمة	الفئة	الوصف التفصيلي	يعتمد على	الحالة	ساعات
E01 – الهوية والمصادقة والصلاحيات – إجمالي 21 ساعة						
E01.T1	تثبيت قاعدة وصول CDM كسياسة صلاحيات	البنية التحتية	تمثيل صلاحية مدير العقود الافتراضية كسياسة ضمن نظام الصلاحيات لا ككود خاص. بحيث يملك وصولاً دائماً لإجراءات إدارته مع إمكان التصرف نيابةً عن الموظف.	E03	جاري	7
E01.T2	حزم صلاحيات الرقابة والمقاول	البنية التحتية	إضافة مفاتيح صلاحيات (resource.action) جديدة إلى كتالوج التأسيس لشخصيتي الرقابة (قراءة/ تدقيق) والمقاول (إجراءات عقده فقط).	E13	مطلوب	5
E01.T3	تدوير كلمة مرور المدير وسياسة كلمات المرور	التشغيل والنشر	تدوير كلمة مرور المدير المُهيأة عند أول إقلاع وفرض سياسة قوة كلمات المرور وقفل المحاولات.	-	مطلوب	2
E01.T4	اختبارات المصادقة وتدوير الرموز	اختبارات الجودة	اختبارات تكامل للدخول وتدوير رمز التحديث ومنع إعادة استخدامه وانتهاء صلاحية رمز الوصول.	-	جاري	7
E02 – تعدد المستأجرين وإقامة البيانات – إجمالي 39 ساعة						
E02.T1	سياق المستأجر ومُرشح العزل	البنية التحتية	سياق مستأجر مرتبط بالطلب ومُرشح مستودع أساسي يقيّد كل استعلام بالجهة. مع رفض أي وصول خارج نطاق الجهة.	E01	مطلوب	12
E02.T2	عزل مسارات الملفات والتخزين	البنية التحتية	ترقيم وعزل مسارات الملفات والتخزين حسب الجهة لضمان عدم تداخل ملفات المستأجرين.	E07	مطلوب	7
E02.T3	اختبار العبور بين المستأجرين	اختبارات الجودة	اختبار آلي يثبت استحالة قراءة جهة لبيانات جهة أخرى عبر أي مسار.	E02.T1	مطلوب	5
E02.T4	إثبات إقامة البيانات والتشفير	التشغيل والنشر	توثيق والتحقق من الاستضافة داخل المملكة، والتشفير عند التخزين والنقل، و TLS، وإقامة النسخ الاحتياطي، بما يوافق NCA و CST.	-	مطلوب	10
E02.T5	عزل التدقيق والتخزين حسب الجهة	البنية التحتية	تقييد سجل التدقيق ومفاتيح التخزين بالجهة ضمن العزل متعدد المستأجرين.	E04,E07	مطلوب	5
E03 – محرك سير العمل وقواعد الأعمال – إجمالي 114 ساعة						
E03.T1	تعميم محرك سير العمل	البنية التحتية	تعميم شريحة سير عمل العقود إلى محرك عام: سجل الحالات وتعريف الانتقالات القابلة لإعادة الاستخدام عبر كل التدفقات.	E01	جاري	24
E03.T2	خط حُرّاس الانتقال	البنية التحتية	تنفيذ خط الحُرّاس لكل انتقال: تحقّق الصلاحية ثم قاعدة العمل ثم تنفيذ الأثر ثم كتابة سجل التدقيق.	E03.T1	مطلوب	18
E03.T3	الإجراءات القياسية ورموز الأخطاء	البنية التحتية	كتالوج الإجراءات القياسية (اعتماد/رفض/إرجاع/ تعديل/إسناد/تعليق/توقيع) ورموز أخطاء المجال الموحدة.	E03.T1	مطلوب	10
E03.T4	مخزن قواعد الأعمال القابل للتهيئة	البنية التحتية	مخزن قابل للتهيئة لحدّ فصل المستندات (BR-01) وتفرّع المباشرة (BR-02) دون كود ثابت.	E03.T1	مطلوب	12

المعرّف	المهمة	الفئة	الوصف التفصيلي	يعتمد على	الحالة	ساعات
E03.T5	سلاسل الاعتماد متعددة الخطوات	البنية التحتية	تعريفات قابلة للهيئة لسلاسل الاعتماد (تفويض وتصعيد) لكل نوع طلب وإجراء.	E03.T1	مطلوب	12
E03.T6	أولية الإسناد والتفويض	البنية التحتية	نقل صلاحية الإجراء للمُسند إليه مع بقاء وصول CDM. مع تسجيل الإسناد في التدقيق.	E01	مطلوب	10
E03.T7	واجهة قراءة سير العمل	البنية التحتية	واجهة قراءة الحالة ومُحلّل «الإجراءات المتاحة لي» بحسب الدور والحالة (يقود أضرار الواجهة).	E03.T1	مطلوب	7
E03.T8	واجهة سير العمل العامة	واجهة المستخدم	خط زمني للحالة وشريط الإجراءات المتاحة ونافذة الإرجاع مع تعليق ومُنقّي الإسناد (RTL وثنائية اللغة).	E03.T7	مطلوب	14
E03.T9	اختبار الانتقال المحكوم	اختبارات الجودة	اختبار طرف-لطرف لانتقال محكوم يجمع تحقّق الصلاحية والقاعدة وكتابة التدقيق.	E03.T2	مطلوب	7
E04 – سجل التدقيق غير القابل للتلاعب – إجمالي 32 ساعة						
E04.T1	مخزن التدقيق التراكمي	البنية التحتية	منفذ تدقيق ومخزن إلحاق-فقط يُكتب من خطوة أثر المحرك (الفاعل والوقت والحالة قبل/بعد).	E03.T1	مطلوب	10
E04.T2	دليل عدم العبث	البنية التحتية	دراسة وتنفيذ أوّلي لسلسلة تجزئة تثبت عدم التلاعب بسجل التدقيق.	E04.T1	مطلوب	7
E04.T3	خط زمني للنشاط	واجهة المستخدم	مكوّن خط زمني للنشاط لكل عقد/طلب مع تصفية بالفاعل والإجراء والتاريخ.	E04.T1	مطلوب	10
E04.T4	قراءة وتصدير التدقيق	البنية التحتية	واجهة قراءة وتصدير سجل التدقيق للرقابة والتقارير.	E04.T1	مطلوب	5
E05 – المراسلات وتوليد الخطابات والأرقام المرجعية – إجمالي 67 ساعة						
E05.T1	محرك قوالب الخطابات ومكتبة البنود	البنية التحتية	محرك قوالب ديناميكية مع مكتبة بنود مُصدّرة (إصدارات) لتوليد الخطابات الرسمية.	E03	مطلوب	14
E05.T2	دمج البيانات والتحقق	البنية التحتية	دمج بيانات العقد/المشروع في القالب مع التحقق من اكتمال الحقول المدموجة.	E05.T1	مطلوب	7
E05.T3	إخراج PDF/Word ثنائي اللغة	البنية التحتية	توليد المخرّج بصيغتي PDF و Word بالعربية والإنجليزية بإعادة استخدام مُصنّر التقارير.	E05.T1	مطلوب	10
E05.T4	تكامّل الرقم المرجعي	تكامّل الأنظمة	تكامّل إصدار الرقم والتاريخ المرجعي عبر نظام الوارد والصادر للمراسلات الرسمية.	E21	مطلوب	12
E05.T5	بوابة الرقم المرجعي	البنية التحتية	منع اكتمال أي انتقال يُصدر خطاباً خارجياً قبل الحصول على رقم مرجعي.	E03,E05.T4	مطلوب	5
E05.T6	مؤلّف الخطابات	واجهة المستخدم	تحرير ومعاينة الخطاب وتمريضه للتوقيع وعرضشارة الرقم المرجعي (RTL).	E05.T1	مطلوب	12
E05.T7	تعبئة ذكية للخطاب	ذكاء	تعبئة مبدئية للخطاب بالذكاء الاصطناعي مع تفسير وتحرير/اعتماد بشري إلزامي قبل الإصدار.	E19	مطلوب	7
E06 – الإشعارات ومركز المهام والمواعيد – إجمالي 54 ساعة						
E06.T1	نموذج الإشعارات وبثّها	البنية التحتية	نموذج إشعارات واشتراك في أحداث المحرك وبثّ داخل التطبيق.	E03	مطلوب	10
E06.T2	مركز المهام والمواعيد	البنية التحتية	اشتقاق المهام من الانتقالات المفتوحة/المُسندة مع المواعيد ووسم التأخّر.	E03	مطلوب	10

المعرّف	المهمة	الفئة	الوصف التفصيلي	يعتمد على	الحالة	ساعات
E06.T3	قنوات واتساب والبريد	تكمّل الأنظمة	قناة واتساب للأعمال (قوالب HSM واشترك / إلغاء) وقناة بريد للإشعارات الخارجية.	E21	مطلوب	10
E06.T4	واجهة المركزين	واجهة المستخدم	واجهة مركز الإشعارات ومركز المهام للمستخدم (RTL وثنائية اللغة).	E06.T1,E06.T2	مطلوب	12
E06.T5	الذكاء النائب باعتماد	ذكاء	طابور «تنفيذ ذكي نيابة» للإجراءات الروتينية باعتماد بشري للمؤثر منها (مرحلة لاحقة).	E19	مطلوب	12
E07 – المستندات والملفات والتوقيع الإلكتروني – إجمالي 37 ساعة						
E07.T1	ملفات المشروع ومركز الحالة	البنية التحتية	نموذج ملفات المشروع حسب المرحلة مع مركز حالة المستندات لإبراز الناقص.	-	جاري	10
E07.T2	تكمّل التوقيع الإلكتروني	تكمّل الأنظمة	تجريد مزود التوقيع وإنشاء المظروف واستقبال إشعار التوقيع وحفظ المُوَقَّع مع التدقيق.	-	مطلوب	17
E07.T3	مركز المستندات	واجهة المستخدم	واجهة مركز المستندات (الحالة وحسب المرحلة والرفع والإصدارات).	E07.T1	مطلوب	10

» سجل المهام – المسار B – ما قبل الترسية والتوقيع

إجمالي المسار: 236 ساعة 22 مهمة

المعرف	المهمة	الفئة	الوصف التفصيلي	يعتمد على	الحالة	ساعات
E08 – إنشاء الطلب واعتماده – إجمالي 45 ساعة						
E08.T1	نطاق الطلب وانتقالات المرحلة 1	البنية التحتية	نطاق الطلب (الحقول والموجز والمرفقات) وانتقالات مرحلة الإنشاء والاعتماد على المحرك.	E03	مطلوب	14
E08.T2	ربط قاعدة فصل المستندات	البنية التحتية	تفعيل BR-01 عند تحديد الميزانية لفصل/دمج المستندين الفني والمالي.	E03.T4	مطلوب	5
E08.T3	بوابات الاعتماد الاختيارية	البنية التحتية	بوابات PMO والأمن السيبراني والمحتوى المحلي قابلة للتفعيل بالتهيئة.	E03	مطلوب	7
E08.T4	واجهة إنشاء الطلب والاعتماد	واجهة المستخدم	شاشات إنشاء/تعديل الطلب وشاشات الاعتماد والإرجاع.	E03.T8	مطلوب	14
E08.T5	اختبار مسارات الطلب	اختبارات الجودة	اختبار المسار السعيد والإرجاع مع تعليق والرفض بسبب.	E08.T1	مطلوب	5
E09 – تجهيز كراسة الشروط – إجمالي 24 ساعة						
E09.T1	انتقالات وإسناد الكراسة	البنية التحتية	انتقالات مرحلة الكراسة وإسنادها لموظف مع نقل صلاحية الإجراء.	E03.T6	مطلوب	7
E09.T2	بناء الكراسة	واجهة المستخدم	واجهة بناء الكراسة والإسناد والمعاينة.	E07	مطلوب	12
E09.T3	إخراج الكراسة	البنية التحتية	توليد مخرَج الكراسة (PDF/Word) عبر محرك المراسلات والمستندات.	E05,E07	مطلوب	5
E10 – اللجان: التأهيل والفتح والتقييم – إجمالي 72 ساعة						
E10.T1	نماذج اللجان والأعضاء	البنية التحتية	نماذج اللجان (تأهيل وفتح وفني وفحص) والأعضاء والأدوار وسير عملها.	E03	مطلوب	17
E10.T2	الدرجات وتقارير اللجان	البنية التحتية	نماذج إدخال الدرجات والتقييم وتوليد تقارير اللجان وتوقيعها.	E10.T1	مطلوب	14
E10.T3	سحب العروض من اعتماد	تكامل الأنظمة	سحب العروض وبيانات الإعلان من «اعتماد» وعكسها في المنصة.	E21	مطلوب	12
E10.T4	فحص أسعار الكميات والمقارنة	البنية التحتية	خدمة فحص أسعار جداول الكميات ومقارنة العروض واقتراح الأقل.	E10.T1	مطلوب	12
E10.T5	تبويب اللجان	واجهة المستخدم	لوحة لكل لجنة مع إدخال الدرجات والتقارير والمتابعة.	E10.T1	مطلوب	17
E11 – الإعلان والترسية وخطاب النوايا – إجمالي 44 ساعة						
E11.T1	الترسية وخطاب النوايا	البنية التحتية	انتقالات الإعلان والترسية وتوليد خطاب الترسية وخطاب النوايا.	E10	مطلوب	17
E11.T2	التأهيل اللاحق والارتباط النهائي	البنية التحتية	التأهيل اللاحق وتأكيد الارتباط النهائي لمبلغ الترسية قبل الاعتماد.	E03	مطلوب	7
E11.T3	نشر الإعلان والترسية	تكامل الأنظمة	نشر الإعلان وبيانات الترسية عبر «اعتماد».	E21	مطلوب	10

المعرّف	المهمة	الفئة	الوصف التفصيلي	يعتمد على	الحالة	ساعات
E11.T4	شاشات الإعلان والترسية	واجهة المستخدم	واجهات الإعلان والترسية وخطاب النوايا.	E11.T1	مطلوب	10
E12 – إعداد العقد وتوقيعه – إجمالي 51 ساعة						
E12.T1	سيناريو التوقيع في اعتماد	البنية التحتية	استيراد بيانات العقد الموقع من «اعتماد» وعكسها في المنصة.	E21	مطلوب	10
E12.T2	سيناريو التوقيع خارج اعتماد	البنية التحتية	إنشاء بيانات العقد من المسودات المعتمدة مع تأكيد مدير العقود.	E03	مطلوب	10
E12.T3	مسار القانونية والمعالم	البنية التحتية	مسار مراجعة القانونية والملاحظات والارتباط النهائي وجدول المعالم.	E03	مطلوب	12
E12.T4	توقيع العقد إلكترونياً	تكامل الأنظمة	توقيع العقد إلكترونياً من الإدارة العليا والمقاول.	E07.T2	مطلوب	7
E12.T5	شاشات صياغة العقد	واجهة المستخدم	واجهات صياغة ومراجعة وتوقيع العقد.	E12.T3	مطلوب	12

» سجل المهام – المسار C – تنفيذ العقد والمقاول

إجمالي المسار: 401 ساعة · 33 مهمة

المعرف	المهمة	الفئة	الوصف التفصيلي	يعتمد على	الحالة	ساعات
E13 – تسجيل المقاول ودعوته – إجمالي 72 ساعة						
E13.T1	نموذج حساب المقاول	البنية التحتية	نموذج حساب المقاول مربوطاً بالسجل التجاري والعقد. مقيّد بالجهة والعقد. مع إزالة التكرار.	E01,E02,E12	مطلوب	17
E13.T2	مجال الدعوة	البنية التحتية	إصدار الدعوة (بوابة عقد موقّع) برمز أحادي منتهي الصلاحية. مع القبول وإعادة الإرسال والإلغاء والتدقيق.	E12,E03	مطلوب	12
E13.T3	تحقق الهوية والتأمينات	تكامل الأنظمة	تحقق هوية المقاول (نفاذ/هوية منشأة) وفحص التأمينات الاجتماعية عند التسجيل.	E21	مطلوب	14
E13.T4	صلاحيات المقاول	البنية التحتية	جزمة صلاحيات المقاول المقيّدة بإجراءات عقده فقط.	E01	مطلوب	5
E13.T5	واجهة دعوة المقاول	واجهة المستخدم	واجهة «دعوة مقاول» للموظف مع حالة الدعوة وإعادة الإرسال.	E13.T2	مطلوب	7
E13.T6	واجهة تسجيل المقاول	واجهة المستخدم	واجهة تسجيل/قبول المقاول وربط السجل التجاري (RTL وثنائية اللغة).	E13.T1	مطلوب	10
E13.T7	اختبار عزل المقاول	اختبارات الجودة	اختبار طرف-لطرف: دعوة ← قبول ← رؤية عقده فقط ومنع العبور بين العقود/الجهات.	E13.T1	مطلوب	7
E14 – بوابة المقاول – إجمالي 72 ساعة						
E14.T1	لوحة المقاول	واجهة المستخدم	لوحة المقاول: تفاصيل المشروع والخط الزمني والأداء وما هو مستحقّ عليه.	E13	مطلوب	14
E14.T2	قسم العقد للمقاول	واجهة المستخدم	قسم العقد: مراجعة وتوقيع وتنزيل ومشاركة.	E07.T2	مطلوب	10
E14.T3	طلبات المقاول	واجهة المستخدم	الطلبات المبدوعة من المقاول (تمديد/تعديل قيمة) تدخل سير العمل المحكوم لدى الجهة (بنية تحتية + واجهة مستخدم).	E16	مطلوب	12
E14.T4	نافذة تحديثات المقاول	واجهة المستخدم	نافذة التحديثات (نص + صور/فيديو) مقابل المعالم وجدول الكميات (بنية تحتية + واجهة مستخدم).	E15	مطلوب	12
E14.T5	الردّ على الخطابات	واجهة المستخدم	الردّ داخل المنصة على خطابات الإنذار/المستحقات/الإشعار لتسجيل الردّ قبل التصعيد (مطلوب للسيناريو المتكامل).	E05,E16	مطلوب	10
E14.T6	اجتماعات المقاول	واجهة المستخدم	تويب الاجتماعات مع محضر وتسجيل وملخص ذكي (مرحلة لاحقة).	E19	مطلوب	14
E15 – تنفيذ المشروع والمباشرة – إجمالي 93 ساعة						
E15.T1	انتقالات المباشرة (BR-02)	البنية التحتية	انتقالات المباشرة بتفرّع نوع المشروع (توريد/صيانة) على المحرك مع الخطابات.	E03.T4,E05	مطلوب	14
E15.T2	نموذج جداول الكميات	البنية التحتية	نموذج جداول الكميات (بند/كمية/سعر وحدة/مُنَجَز/متبقي) مع الاستيراد. يغذي ترحيل عقد الاستكمال.	–	مطلوب	17

المعرّف	المهمة	الفئة	الوصف التفصيلي	يعتمد على	الحالة	ساعات
E15.T3	المعالم والتقدم وحساب التأخر	البنية التحتية	نموذج المعالم والتقدم والمخطط مقابل الفعلي وحساب التأخر.	E15.T2	مطلوب	12
E15.T4	المستخلصات	البنية التحتية	المستخلصات مقابل جداول الكميات وتوفر ميزانية المالية، محكومة ومُدققة.	E15.T2,E21	مطلوب	14
E15.T5	لوحة تنفيذ المشروع	واجهة المستخدم	لوحة تنفيذ المشروع (خط زمني، معالم، تقدم الكميات، وسوم التأخر المدفوعات) – RTL وبتصميم غير نمطي.	E15.T3	مطلوب	19
E15.T6	شاشات المباشرة وتسليم الموقع	واجهة المستخدم	واجهات المباشرة ومحضر استلام الموقع وخطاب الإحالة.	E15.T1	مطلوب	10
E15.T7	اختبار المباشرة	اختبارات الجودة	اختبار مباشرة التوريد ومباشرة الصيانة مع لجنة استلام الموقع.	E15.T1	مطلوب	7
E16 – إجراءات دورة حياة العقد (18 إجراءً) – إجمالي 101 ساعة						
E16.T1	إطار الإجراءات على المحرك	البنية التحتية	إطار «إجراء تنفيذ» = مُطلق + قاعدة شرط مسبق + دور مالك + سلسلة اعتماد + قالب خطاب + أثر حالة/مالية/ضمان + خطاف اقتراح ذكي.	E03.T1,E05	مطلوب	24
E16.T2	مجموعة إجراءات النواة	البنية التحتية	ثماني إجراءات (بدء أعمال، إنذار، إنذار نهائي، سحب، أمر تعديلي، تمديد، إيقاف، استئناف) كصفوف تهيئة على الإطار.	E16.T1	مطلوب	19
E16.T3	مجموعة إجراءات المرحلة 2	البنية التحتية	مستحقات، تنازل، تأييد عمالة، استلام ابتدائي/نهائي، إنهاء، ضمانات، تفويض ممثل العقد.	E16.T1,E18,E13	مطلوب	22
E16.T4	اقتراح وتفسير الإجراءات	ذكاء	اقتراح الإجراء المناسب وتفسيره لكل إجراء تحت إشراف بشري.	E19	مطلوب	12
E16.T5	واجهة مُطلق الإجراءات	واجهة المستخدم	مُطلق الإجراءات في واجهة العقد/المشروع مع معاينة الخطاب والاعتماد والتوقيع.	E03.T8,E05.T6	مطلوب	14
E16.T6	اختبار الإجراءات	اختبارات الجودة	اختبار طرف-لطرف لكل مجموعة (صلاحية + قاعدة + خطاب + رقم مرجعي + تدقيق + حالة).	E16.T2	مطلوب	10
E17 – ربط العقود وعقد الاستكمال – إجمالي 34 ساعة						
E17.T1	نموذج علاقات العقود	البنية التحتية	نموذج روابط العقود المُصنّفة وعرض العلاقة على الطرفين.	E16	مطلوب	10
E17.T2	توليد عقد الاستكمال	البنية التحتية	توليد عقد الاستكمال من سحب الأعمال مع ترحيل جداول الكميات المتبقية والربط بالأصلي.	E16,E15.T2	مطلوب	12
E17.T3	واجهة العقود المرتبطة	واجهة المستخدم	واجهة العقود المرتبطة وعرض سلسلة الأصل ↔ الاستكمال.	E17.T1	مطلوب	7
E17.T4	اختبار الاستكمال	اختبارات الجودة	اختبار طرف-لطرف: سحب الأعمال ← إنشاء عقد استكمال مرتبط بالمتبقي.	E17.T2	مطلوب	5
E18 – الإقفال وتقييم المقاول – إجمالي 29 ساعة						
E18.T1	انتقالات الاستلام	البنية التحتية	انتقالات الاستلام الابتدائي والنهائي مع اعتماد اللجنة والإدارة العليا.	E16	مطلوب	12
E18.T2	الإفراج عن الضمان والإقفال	البنية التحتية	الإفراج عن الضمان النهائي وإقفال العقد.	E18.T1	مطلوب	7
E18.T3	تقييم المقاول	البنية التحتية	نموذج تقييم المقاول وتغذية مؤشر موثوقية الموردين (بنية تحتية + واجهة مستخدم).	E20	مطلوب	10

» سجل المهام – المسار D – الذكاء والتقارير

إجمالي المسار: 187 ساعة · 14 مهمة

المعرف	المهمة	الفئة	الوصف التفصيلي	يعتمد على	الحالة	ساعات
E19 – طبقة الذكاء الاصطناعي و HITL – إجمالي 116 ساعة						
E19.T1	مجال التوصية والاعتماد	البنية التحتية	كائن «التوصية» (توصية + تبرير + ثقة + مصادر) مع قرار بشري مسجل في التدقيق.	E04	مطلوب	12
E19.T2	محرك الإجراء التالي الأفضل	ذكاء	محرك يوصي بالإجراء التالي فوق حالة العقد/المشروع مع تبريره.	E03,E15	جاري	17
E19.T3	خدمة تسجيل المخاطر	ذكاء	تسجيل درجات المخاطر (تأخر/مالية/امثال) بمسبباتها لتغذية خريطة المخاطر.	E15	مطلوب	17
E19.T4	ماسح الامثال والبنود	ذكاء	مسح العقود والخطابات بحثاً عن بنود إلزامية ناقصة وانحرافات.	E05,E12	مطلوب	14
E19.T5	المساعد المعرفي	ذكاء	مساعد وبحث سياقي فوق الأنظمة ونظام المنافسات والمشتريات وكل عقد.	-	مطلوب	17
E19.T6	كشف الاحتيال والتواطؤ	ذكاء	كشف تواطؤ العروض والشذوذ المالي وتضارب المصالح – استشاري تحت إشراف (مرحلة لاحقة).	-	مطلوب	24
E19.T7	حد المعدل وعلم التفعيل	البنية التحتية	حد معدل استدعاء الذكاء الاصطناعي وعلم تفعيله لكل مستأجر.	-	جاري	5
E19.T8	سطح الاعتماد (HITL)	واجهة المستخدم	واجهة عرض التوصية وتفسيرها مع قرار اعتماد/تعديل/رفض.	E19.T1	مطلوب	10
E20 – اللوحات والتقارير – إجمالي 71 ساعة						
E20.T1	لوحة مدير العقود	واجهة المستخدم	لوحة الأداء وملخص العقود بتنبهات بالألوان والمستودع ومتتبع دورة الحياة.	E15,E16,E04	مطلوب	17
E20.T2	لوحة الإدارة العليا	واجهة المستخدم	لوحة استراتيجية للالتزامات والأداء والامثال وخريطة المخاطر الحرارية.	E19	مطلوب	17
E20.T3	لوحة المستخدم النهائي	واجهة المستخدم	لوحة المستخدم: مشاريعه وطلباته المعقدة وحالة مستنداته وخطه الزمني.	-	مطلوب	10
E20.T4	لوحة الرقابة والامثال	واجهة المستخدم	عرض الامثال وسجل التدقيق للجهات الرقابية.	E04	مطلوب	10
E20.T5	توسيع مودل التقارير	البنية التحتية	توسيع تغطية مودل التقارير والملخص التنفيذي (بناءً على المحرك القائم).	-	جاري	10
E20.T6	مؤشر موثوقية الموردين	البنية التحتية	تجميع مؤشر موثوقية الموردين من تقييمات المقاولين والأداء.	E18	مطلوب	7

» سجل المهام – المسار E – التكاملات والتوطين

إجمالي المسار: 130 ساعة • 9 مهمة

المعرف	المهمة	الفئة	الوصف التفصيلي	يعتمد على	الحالة	ساعات
E21 – التكاملات الوطنية – إجمالي 87 ساعة						
E21.T1	مُحوّل اعتماد	تكامل الأنظمة	مُحوّل «اعتماد» (نشر/عروض/مدفوعات) خلف منفذ مجالي مع مهام مزامنة وتسوية.	E02	مطلوب	24
E21.T2	مُحوّل نفاذ	تكامل الأنظمة	مُحوّل «نفاذ» للهوية والمصادقة.	E02	مطلوب	12
E21.T3	مُحوّل وزارة المالية	تكامل الأنظمة	مُحوّل وزارة المالية (الميزانية وفحص العروض وخطط الدفع).	E02	مطلوب	17
E21.T4	مُحوّل التأمينات الاجتماعية	تكامل الأنظمة	مُحوّل GOSI للتحقق من امتثال الموردين.	E02	مطلوب	10
E21.T5	مُحوّلات مساندة	تكامل الأنظمة	التوقيع الإلكتروني وERP/CRM وواتساب (مزامنة وإشعارات).	E02	مطلوب	14
E21.T6	بيئات محاكاة التكامل	التشغيل والنشر	بيئات محاكاة واختبار عقود التكامل للتطوير قبل توفّر الربط الفعلي.	-	مطلوب	10
E22 – رؤية 2030 والتوطين – إجمالي 43 ساعة						
E22.T1	لوحة التوطين	واجهة المستخدم	لوحة التوطين ومؤشر المحتوى المحلي والنطاقات/السعودية.	E20,E21	مطلوب	17
E22.T2	أتمتة الزكاة والقيمة المضافة	البنية التحتية	أتمتة الزكاة وضريبة القيمة المضافة في الحسابات المرتبطة.	-	مطلوب	12
E22.T3	مخاطر المشاريع الكبرى	ذكاء	تحليل مخاطر المشاريع الكبرى ومعالجة اللغة العربية.	-	مطلوب	14

» سجل المهام – المسار S – الأمن السيبراني والحماية (ECC)

إجمالي المسار: 278 ساعة · 24 مهمة

المعرف	المهمة	الفئة	الوصف التفصيلي	يعتمد على	الحالة	ساعات
حوكمة الأمن السيبراني (ECC-1) – إجمالي 67 ساعة						
S1.T1	سياسة واستراتيجية الأمن السيبراني	حماية	وضع وتوثيق واعتماد استراتيجية وسياسات وإجراءات الأمن السيبراني للمنصة ونشرها على ذوي العلاقة (ECC 1-1/1-3).	-	مطلوب	17
S1.T2	أدوار ومسؤوليات وحوكمة الأمن	حماية	تحديد أدوار ومسؤوليات الأمن السيبراني (RACI) وإطار الحوكمة والإشراف داخل المنصة وللجهة (ECC 1-4).	-	مطلوب	7
S1.T3	إدارة مخاطر الأمن السيبراني	حماية	منهجية وسجل مخاطر سيبرانية وتقييم المخاطر في مراحل المشاريع التقنية وقبل التغييرات الجوهرية وخدمات الأطراف الخارجية (ECC 1-5/1-6).	-	مطلوب	14
S1.T4	الالتزام والتدقيق الدوري (ECC)	حماية	الالتزام بالمتطلبات التشريعية والتنظيمية وإجراء التقييم الذاتي والتدقيق الدوري لقياس مطابقة الضوابط (ECC 1-7/1-8).	-	مطلوب	12
S1.T5	الأمن السيبراني للموارد البشرية	حماية	بنود السرية في العقود والفحص الأمني للوظائف الحساسة ومتطلبات ما قبل وأثناء وبعد العلاقة الوظيفية (ECC 1-9).	-	مطلوب	10
S1.T6	التوعية والتدريب بالأمن السيبراني	حماية	برنامج توعية دوري (التصيد والأجهزة والتواصل الاجتماعي) وتدريب متخصص للفرق التقنية (ECC 1-10).	-	مطلوب	7
تعزيز الأمن السيبراني (ECC-2) – إجمالي 177 ساعة						
S2.T1	تقوية الهويات والصلاحيات (MFA/PAM)	حماية	مصادقة متعددة العناصر للحسابات الحساسة والدخول عن بعد وإدارة الصلاحيات المميزة وأقل صلاحية وفصل المهام (ECC 2-2)؛ يكمل E01.	E01	مطلوب	14
S2.T2	التشفير وإدارة المفاتيح	حماية	التشفير حسب التصنيف عند التخزين والنقل وإدارة دورة حياة المفاتيح وفق معايير الهيئة (ECC 2-8)؛ يكمل E02.	E02	مطلوب	14
S2.T3	حماية الأنظمة والأجهزة	حماية	مكافحة البرمجيات الضارة وإدارة التحديثات والحزم وتحسين الإعدادات ومزامنة التوقيت (ECC 2-3).	-	مطلوب	12
S2.T4	حماية البريد الإلكتروني	حماية	تصفية التصيد والبريد المزج وتطبيق SPF/DKIM/DMARC وحماية التهديدات المتقدمة (ECC 2-4).	E06	مطلوب	10
S2.T5	أمن الشبكات Firewall/IPS/DDoS (S)	حماية	تجزئة الشبكة ودفاع متعدد المراحل وجدر الحماية وأنظمة منع الاختراق وحماية حجب الخدمة وأمن DNS وعزل بيئة الإنتاج (ECC 2-5).	-	مطلوب	17
S2.T6	أمن الأجهزة المحمولة BYOD	حماية	فصل بيانات الجهة على الأجهزة الشخصية والحذف عن بعد عند فقدان أو انتهاء العلاقة (ECC 2-6).	-	مطلوب	7
S2.T7	حماية البيانات حسب التصنيف	حماية	تصنيف البيانات وضوابط منع التسريب والإخفاء/ التعمية حسب مستوى الحساسية (ECC 2-7)؛ يكمل E02.	E02	مطلوب	10

المعرّف	المهمة	الفئة	الوصف التفصيلي	يعتمد على	الحالة	ساعات
S2.T8	النسخ الاحتياطي واختبار الاستعادة	حماية	شمولية النسخ للأصول الحساسة والاستعادة السريعة واختبار دوري لفعالية الاستعادة (ECC 2-9).	-	مطلوب	7
S2.T9	إدارة الثغرات	حماية	فحص دوري للثغرات وتصنيفها ومعالجتها والتحقق قبل الإنتاج والاشتراك في مصادر التنبيهات (ECC 2-10).	-	مطلوب	12
S2.T10	اختبار الاختراق الدوري	حماية	اختبار اختراق دوري للخدمات الخارجية والمواقع وتطبيقات الويب والجوال والدخول عن بعد (ECC 2-11).	-	مطلوب	12
S2.T11	سجلات الأحداث والمراقبة (SIEM)	حماية	تجميع سجلات الأحداث والمراقبة المستمرة عبر SIEM وحفظها لمدة لا تقل عن 12 شهراً (ECC 2-12): يبنى على E04.	E04	مطلوب	17
S2.T12	إدارة حوادث الأمن السيبراني	حماية	خطط استجابة وتصنيف الحوادث والإبلاغ للهيئة والاستفادة من معلومات التهديدات (ECC 2-13).	-	مطلوب	14
S2.T13	الأمن المادي لمراكز البيانات	حماية	ضوابط الدخول والمراقبة (CCTV) للأماكن الحساسة – غالباً عبر مزود الاستضافة (ECC 2-14).	E21	مطلوب	5
S2.T14	حماية تطبيقات الويب (WAF)	حماية	جدار حماية تطبيقات الويب ومعمارية متعددة الطبقات وHTTPS وسياسة جلسات آمنة (ECC 2-15).	-	مطلوب	12
S2.T15	دورة تطوير آمنة (Secure SDLC)	حماية	معايير ترميز آمن ومكتبات موثوقة وفحص أمني وتحسين الإعدادات قبل الإطلاق (ECC 1-6).	-	مطلوب	14
صمود الأمن السيبراني (ECC-3) – إجمالي 12 ساعة						
S3.T1	صمود الأمن في استمرارية الأعمال	حماية	دمج الأمن السيبراني في استمرارية الأعمال: أهداف RTO/RPO وخطة تعافٍ واختبارها (ECC 3-1).	-	مطلوب	12
الأطراف الخارجية والحوسبة السحابية (ECC-4) – إجمالي 22 ساعة						
S4.T1	أمن الأطراف الخارجية والموردين	حماية	متطلبات تعاقدية وتقييم سيبراني للموردين والأطراف الخارجية قبل وأثناء التعاقد (ECC 4-1).	-	مطلوب	10
S4.T2	أمن الحوسبة السحابية والاستضافة	حماية	إقامة البيانات داخل المملكة ونموذج المسؤولية المشتركة وتحسين إعدادات السحابة (ECC 4-2): يكمل E02.	E02	مطلوب	12

»» سجل المهام – مهام عامة شاملة (اختبارات الجودة وتشغيل وتصميم وإدارة)

إجمالي المسار: 131 ساعة 6٠ مهمة

المعرّف	المهمة	الفئة	الوصف التفصيلي	يعتمد على	الحالة	ساعات
مهام عامة شاملة – إجمالي 131 ساعة						
X.QA1	إطار الاختبارات الآلية	اختبارات الجودة	إطار اختبارات آلية (وحدة + طرف-لطرف) عبر الوحدات مع تغطية للانتقالات والصلاحيات والتدقيق.	-	مطلوب	24
X.OPS1	خطوط CI/CD والبيئات	التشغيل والنشر	خطوط التكامل والنشر المستمر وبيئات التشغيل (تجريب/إنتاج) والمراقبة.	-	مطلوب	19
X.OPS2	النسخ الاحتياطي والتعافي	التشغيل والنشر	النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث والمراقبة والتنبه.	-	مطلوب	14
X.UX1	نظام التصميم i18n	تصميم	نظام التصميم ومكونات RTL وملفات الترجمة (عربي/إنجليزي) لكل الوحدات.	-	مطلوب	24
X.PM1	إدارة المشروع وورش القرار	إدارة	إدارة المشروع وورش القرار وتوثيق المتطلبات والتتبع طوال فترة التنفيذ.	-	مطلوب	36
X.DOC1	وثائق المعمارية والتدريب	إدارة	وثائق المعمارية وأدلة المستخدم والتدريب.	-	مطلوب	14
